As Oy Kupittaankatu 11-13

Aikataulu
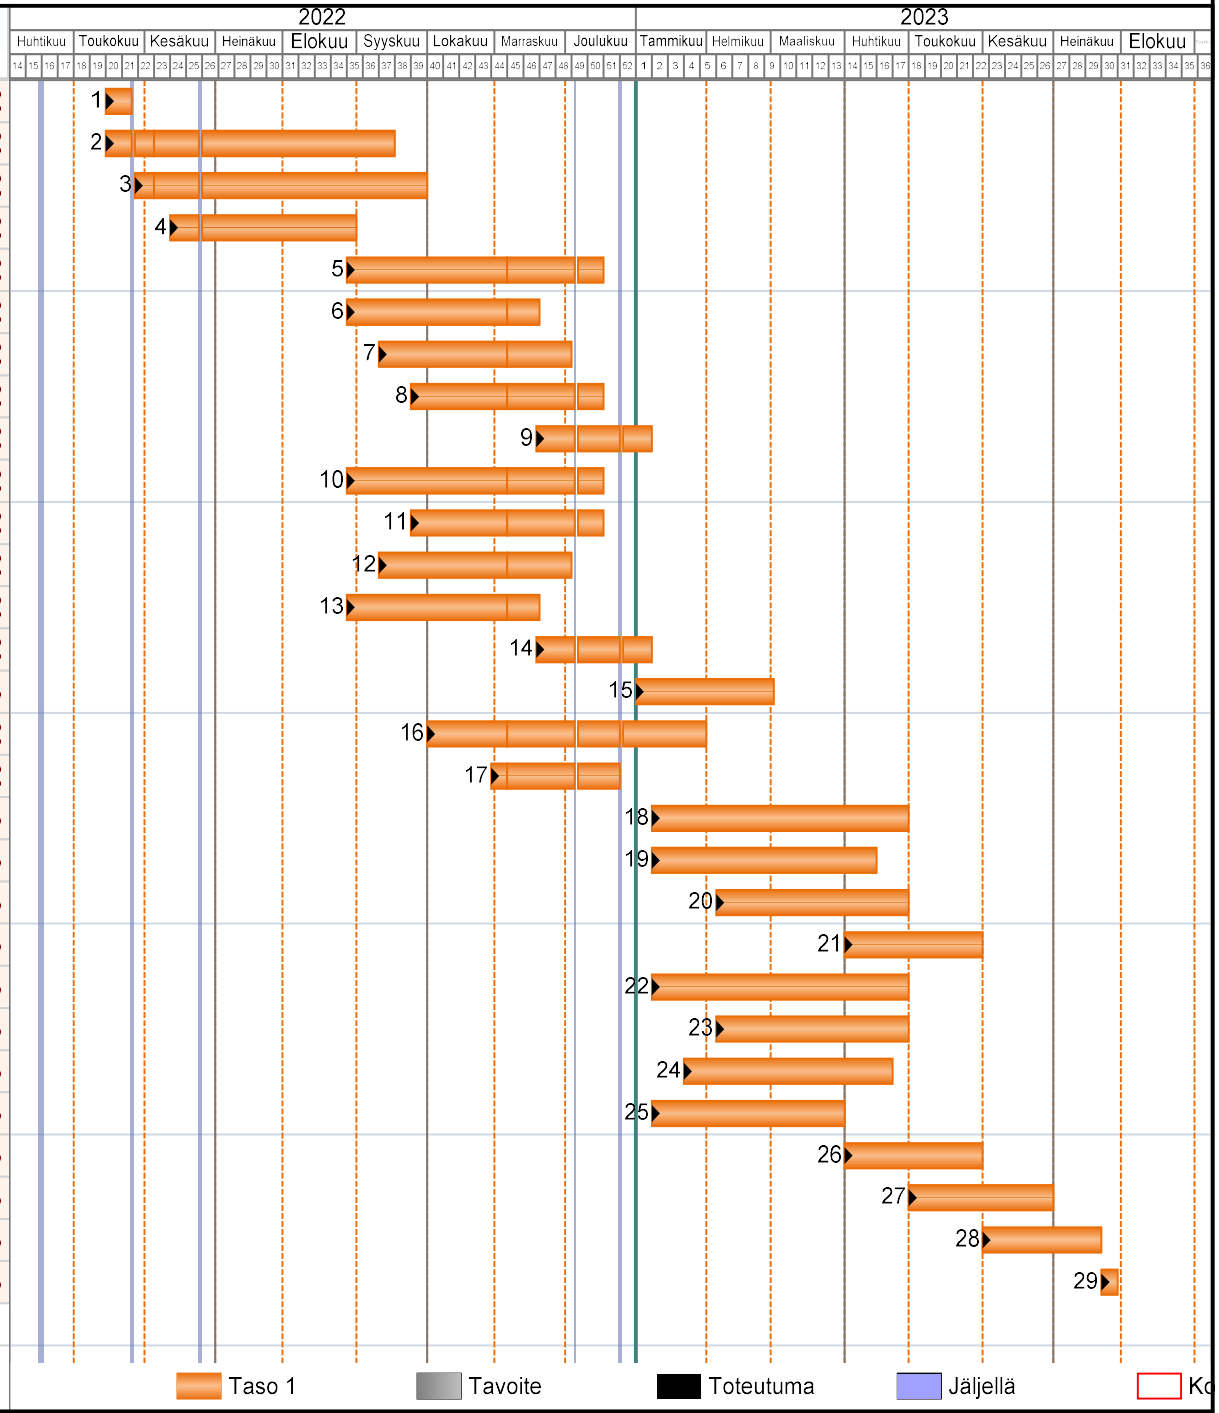
	Hier	Nimi	Aik. alku
1	1	Työmaan perustaminen	16.05.22
2 *	2	Kaivuutyöt	16.05.22
3	3	Kellarin työt talo 2.	27.05.22
4	4	Pystynousut talo 2.	13.06.22
5	5	Asunnot A-porras	29.08.22
6	6	Linja 1.as 1,4,7,9,11,13	29.08.22
7	7	Linja 2. as 2,5,7,9,11,13	12.09.22
8	8	Linja 3. as 3,6,8,10,12,14	26.09.22
9	9	Porrashuone A-porras	18.11.22
10	10	Asunnot B-porras	29.08.22
11	11	Linja 3. as 15,18,21,24,27,30	26.09.22
12	12	Linja 4. as 16,19,22,25,28,31	12.09.22
13	13	Linja 5. as 17,20,23,26,29,32	29.08.22
14	14	Porrashuone B-porras	18.11.22
15	15	Yleiset tilat talo 2.	02.01.23
16	16	Kellarin työt talo 1.	03.10.22
17	17	Pystynousut talo 1.	31.10.22
18	18	Asunnot C-porras	09.01.23
19	19	Linja 1. as 33,35,37,39,41,43	09.01.23
20	20	Linja 2. as 34,36,38,40,42,44	06.02.23
21	21	Porrashuone C-porras	03.04.23
22	22	Asunnot D-porras	09.01.23
23	23	Linja 2. as 45,49,53,57,61,65	06.02.23
24	24	Linja 3. as 46,47,50,51,54,55,58,59,62,63,66,67	23.01.23
25	25	Linja 4. as 48,52,56,60,64,68	09.01.23
26	26	Porrashuone D-porras	03.04.23
27	27	Yleiset tilat talo 1.	01.05.23
28	28	Piha-alueen viimeistely	01.06.23
29	29	Luovutus	24.07.23
